

RELATÓRIO GERENCIAL DE OBRA PATEO DONA TECLA AGOSTO 2017

1. Andamento da Obra

1.1 Superestrutura

- **Bloco A / Bloco B**
- Finalizado;

1.2 Alvenaria e Fechamentos

- **Bloco A / Bloco B**
- Finalizado;

1.3 Revestimento Interno

- **Bloco A**
- Exec. Pintura – Finalizado – Revisão Geral.
- **Bloco B**
- Exec. Pintura – Finalizado – Revisão Geral.

1.4 Pisos Internos

- **Bloco A / Bloco B**
- Finalizado.

1.5 Impermeabilização

- **Bloco A / Bloco B / Área Externa**
- Finalizado.

RELATÓRIO GERENCIAL DE OBRA PATEO DONA TECLA AGOSTO 2017

1.6 Forros

- **Bloco A / Bloco B**
- Finalizado.

1.7 Revestimento Externo

- **Bloco A / Bloco B**
- Finalizado.

1.8 Instalações Elétricas

- **Bloco A / Bloco B**
- Instalação de iluminação externa – Em andamento.

1.9 Instalações Hidráulicas

- **Bloco A / Bloco B**
- Finalizado.

1.10 Esquadrias Metálicas

- **Bloco A / Bloco B**
- Revisão e Ajustes dos Caixilhos de Alumínio – Térreo – Em andamento.

1.11 Esquadrias Madeiras

- **Bloco A / Bloco B**
- Finalizado.

RELATÓRIO GERENCIAL DE OBRA PATEO DONA TECLA AGOSTO 2017

1.12 Áreas Externas - Térreo

- Colocação de Pedras (passeios externos) – Finalizado;
- Pintura muros internos – Em andamento;
- Paisagismo – Em andamento.

1.13 Elevadores

- **Bloco A / Bloco B**
 - Entregues e em funcionamento.

1.14 Limpeza Final

- **Bloco A**
 - Limpeza Grossa e Fina dos Aptos – 3º ao 12º Andar.
- **Bloco B**
 - Finalizado – Revisão Geral.

RELATÓRIO GERENCIAL DE OBRA PATEO DONA TECLA AGOSTO 2017

2. Acompanhamento das Etapas

Torre A	
Etapa	%
Fundação Profunda	100,00
Blocos e Baldrames	100,00
Estrutura	100,00
Alvenaria	100,00
Esquadrias Metálicas	75,76
Esquadrias de Madeira	100,00
Cobertura	100,00
Impermeabilização	100,00
Revestimento Interno	100,00
Revestimento Externo	100,00
Forros	100,00
Pintura	100,00
Instalações Elétricas	99,58
Instalações Hidráulicas	100,00
Instalações Mecânicas	100,00
Louças e Metais	100,00
Limpeza Final	61,11

Torre B	
Etapa	%
Fundação Profunda	100,00
Blocos e Baldrames	100,00
Estrutura	100,00
Alvenaria	100,00
Esquadrias Metálicas	100,00
Esquadrias de Madeira	100,00
Cobertura	100,00
Impermeabilização	100,00
Revestimento Interno	100,00
Revestimento Externo	100,00
Forros	100,00
Pintura	100,00
Instalações Elétricas	98,53
Instalações Hidráulicas	100,00
Instalações Mecânicas	100,00
Louças e Metais	100,00
Limpeza Final	100,00

Periferia/Subsolos A	
Etapa	%
Fundação Profunda	100,00
Blocos e Baldrames	100,00
Estrutura	100,00
Alvenaria	100,00
Contenções	100,00

Periferia/Subsolos B	
Etapa	%
Fundação Profunda	100,00
Blocos e Baldrames	100,00
Estrutura	100,00
Alvenaria	100,00

RELATÓRIO GERENCIAL DE OBRA PATEO DONA TECLA AGOSTO 2017

2. Acompanhamento das Etapas


MEDIÇÃO GLOBAL

Obra	Incidência %	Acum. Mês %
Habitação	77,97	97,27
Infraestrutura	22,03	99,53

Global	100,00	97,77
--------	--------	-------

3. Cronograma

- Progresso Físico Acumulado – Curva S (%)

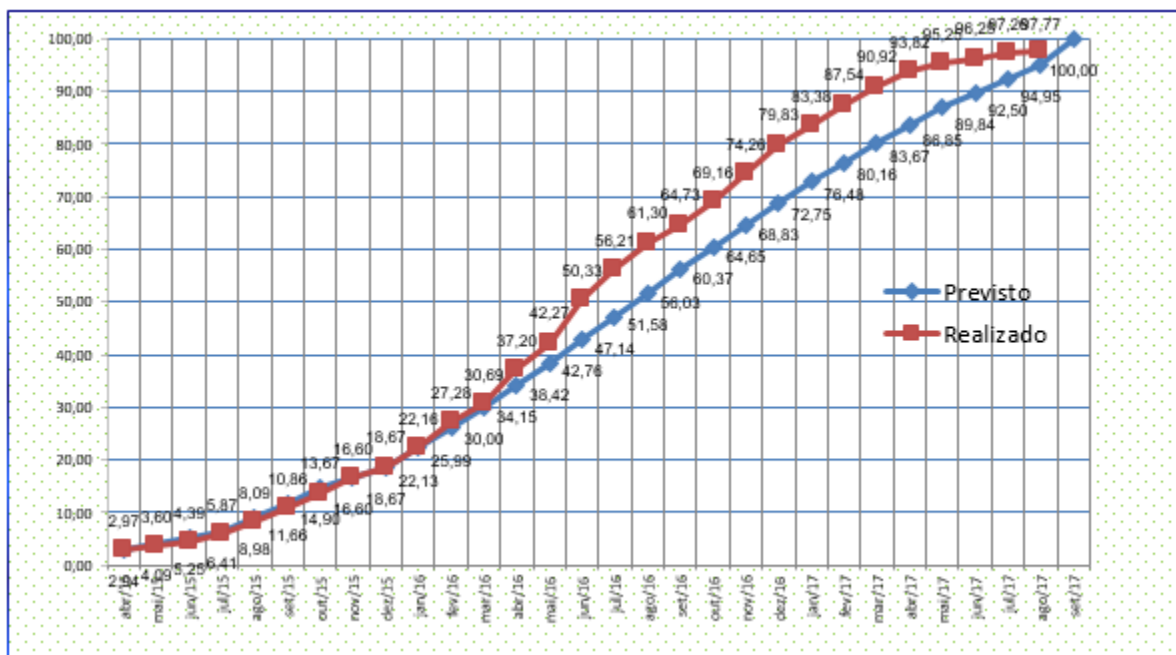

RELATÓRIO GERENCIAL DE OBRA PATEO DONA TECLA AGOSTO 2017

4. Ilustrações

4.1 Fotos



Figura 1– Vista Passeio Térreo Externo



Figura 2– Vista Playground



Figura 3– Vista Passeio Térreo Externo



Figura 4– Vista Churrasqueiras



Figura 5– Vista Fonte



Figura 6– Vista Piscinas

RELATÓRIO GERENCIAL DE OBRA PATEO DONA TECLA AGOSTO 2017

4. Ilustrações

4.1 Fotos

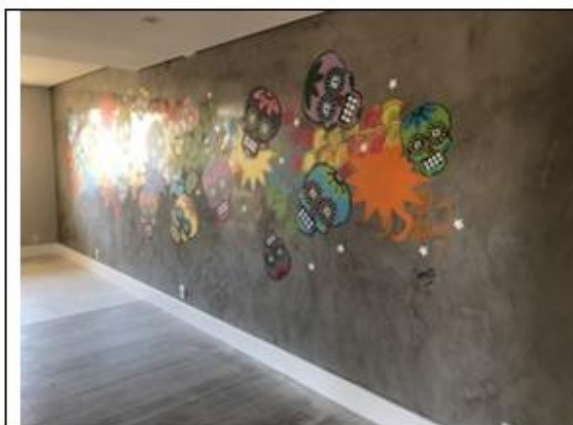


Figura 7- Vista Grafite Espaço Teen



Figura 8- Vista Grafite Brinquedoteca
